



Ficha Técnica de Cierre del Proyecto

Programa () Proyecto () Perfil (X)

Contenido

Datos de la Fase de Ejecución del Proyecto – Ficha Senplades	2
Datos del proyecto	2
Período de ejecución del Proyecto	2
Costos del Proyecto	2
Beneficiarios.....	2
Objetivos e Indicadores del proyecto:	3
Metas físicas por componente.....	3
Principales problemas o limitaciones en la fase de ejecución del proyecto	4
Lecciones aprendidas:.....	4
Sostenibilidad: fase de Operación:	5
Análisis presupuestario del proyecto.....	5
Presupuesto del proyecto:.....	5
Resumen descriptivo según ítem de gasto	6
Datos personales:.....	7

Datos de la Fase de Ejecución del Proyecto – Ficha Senplades

Datos del proyecto

Nombre del Programa o Proyecto	PLAN DE ACREDITACIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS DE LAS UNIVERSIDADES, SERVICIOS DE PATROCINIO, DEFENSA Y ASESORÍA JURÍDICA PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
Código único del proyecto	50610000.733.5678
Institución rectora del proyecto	SIN MINISTERIO COORDINADOR
Institución(s) ejecutora (s)	DEFENSORIA PÚBLICA - PLANTA CENTRAL
Número de oficio y fecha de prioridad del proyecto por parte de SENPLADES	Oficio No. SENPLADES-SIP-dap-2010-1010 Quito, 15 de diciembre de 2010
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo	
- Objetivo del PND 2009 - 2013	OBJETIVO 9: GARANTIZAR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS Y LA JUSTICIA
- Política del PND 2009 - 2013	POLÍTICA 9.3: IMPULSAR UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDEPENDIENTE, EFICIENTE, EFICAZ, OPORTUNA, IMPARCIAL, ADECUADA E INTEGRAL
- Meta del PND	SIN META DIRECTA
- Objetivo Estratégico Institucional	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA GRATUITA Y DE CALIDAD PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS CIUDADANOS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Ubicación del Proyecto (Administración)	
- Zona	9 (Distrito Metropolitano de Quito)
- Provincia	1 (Pichincha)
- Cantón	1 (Quito)

Período de ejecución del Proyecto

Fecha estimada de inicio	01/01/2011
Fecha real de inicio	01/01/2012
Fecha estimada de finalización	31/12/2013
Fecha real de finalización	15/12/2013
<i>De ser el caso, describa la principal causa del desfase en la ejecución</i>	El desfase de la ejecución se debe a la no asignación presupuestaria en el año 2011, por parte del Ministerio de Finanzas

Costos del Proyecto

Costo total estimado US\$	190.100,00
Costo real US\$	149.296,70
Fuentes de financiamiento	Fiscal
<i>De ser el caso, describa la principal causa del desfase en el costo del proyecto</i>	Se agruparon las actividades del proyecto, para que el costo del momento de la contratación sea uno solo. Generando un ahorro al estado en \$ 40.803,30

Beneficiarios

Total beneficiarios previstos en la formulación del proyecto	Hombres: 2.201.716 Mujeres: 6.000.000 Otros (familias, comunidades, etc.) (especifique):
Total Beneficiarios al finalizar el proyecto	Hombres: 50.688 Mujeres: 76.032 Otros(familias, comunidades, etc.) (especifique):

<i>De ser el caso, describa la principal causa del desfase en cuanto al número de beneficiarios</i>	No está bien identificados los beneficiarios directos, en la ficha del proyecto.
---	--

Objetivos e Indicadores del proyecto:

Objetivos	Descripción
Fin	El proyecto contribuirá a garantizar el pleno e igual acceso al sistema de justicia, y a la protección de los derechos de las personas en indefensión que, por su condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal.
Propósito	Se ha diseñado y aplicado un sistema de reglamentación, acreditación y seguimiento para los servicios jurídicos gratuitos a cargo de las facultades de jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas del país, y de los organismos seccionales, organizaciones comunitarias y fundaciones sin finalidad de lucro.

	Indicadores	
	Programados	Logrados
De fin	Lograr hasta diciembre de 2013, el acceso universal a la justicia, reflejado en un ratio de indefensión no superior al 30%. Implementar hasta diciembre de 2013, servicios de defensoría pública gratuita en todas las materias.	En el año de 2013, el 14% de la población no ha podido acceder a la Justicia. Se ha implementado servicios de Defensa pública en todas las provincias.
De propósito	Hasta diciembre del 2013, la Defensoría Pública acreditará 1337 Consultorios Jurídicos Gratuitos en todo el país, los mismos que cubrirán la demanda de las personas en estado de indefensión	La Defensoría Pública ha acreditado al 100% de consultorios Jurídicos de las universidades.
<i>De ser el caso, describa la principal causa de los resultados de estos indicadores</i>	El código orgánico de la función judicial, en el artículo 292, 293 y 294, establece la obligatoriedad de acreditarse a los Consultorios Jurídicos Gratuitos a cargo de las Facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas, y otros consultorios pero cuya característica sea sin finalidad de lucro.	

Metas físicas por componente

Nombre del componente	Metas programadas	Metas logradas	Comentarios
La defensoría pública cuenta con una línea de base y la normativa jurídica para el diseño de un sistema de acreditación y seguimiento de consultorios jurídicos de universidades y otras organizaciones que brindan servicios legales a la comunidad.	Hasta junio 2011, se cuenta con la línea de base de universidades y organizaciones que brindan servicios legales a la comunidad.	Hasta Diciembre 2012, se cuenta con la línea de base de universidades y organizaciones que brindan servicios legales a la comunidad.	Problemas en la asignación de presupuesto

La defensoría pública cuenta con un modelo de gestión para la acreditación, seguimiento y evaluación de consultorios jurídicos que brindan servicios de patrocinio, defensa y asesoría jurídica a personas de escasos recursos económicos y grupos de atención prioritaria.	Hasta diciembre 2011, se ha expedido el Reglamento para acreditación de consultorios jurídicos gratuitos.	Hasta diciembre 2012, se ha expedido el Reglamento para acreditación de consultorios jurídicos gratuitos.	Problemas en la asignación de presupuesto
La defensoría pública cuenta con un modelo de gestión para la acreditación, seguimiento y evaluación de consultorios jurídicos que brindan servicios de patrocinio, defensa y asesoría jurídica a personas de escasos recursos económicos y grupos de atención prioritaria.	Hasta junio 2011 se ha implementado la unidad de gestión de centros jurídicos gratuitos.	Hasta Octubre 2012 se ha implementado la unidad de gestión de centros jurídicos gratuitos.	Problemas en la asignación de presupuesto
Se ha difundido el proceso de acreditación y servicio brindado por los consultorios jurídicos de universidades y otras organizaciones.	Hasta diciembre 2013 se ha ejecutado el plan de difusión de los servicios de los consultorios jurídicos gratuitos.	Hasta diciembre 2013 se ha ejecutado el plan de difusión de los servicios de los consultorios jurídicos gratuitos.	Problemas en la asignación de presupuesto

Principales problemas o limitaciones en la fase de ejecución del proyecto

Señale con una (x) los principales problemas encontrados durante la ejecución:

- En el diseño del proyecto (X)
- Problemas en la administración del proyecto ()
- Problemas en la fase contractual (marco legal) ()
- Desfases por cambios de autoridades ()
- Problemas en la asignación de presupuesto (X)
- Falta de personal capacitado ()
- Problemas de riesgos naturales, geográficos ()
- Problemas de coordinación interinstitucional ()
- Otros: (describa) ()

Lecciones aprendidas:

Señale brevemente de manera objetiva y crítica las lecciones aprendidas del proceso seguido en la ejecución del proyecto:	<ul style="list-style-type: none"> • La estructura de diseño de trabajo de los proyectos debe ser ajustados constantemente según las condiciones que se presenten. • Se debe implementar una oficina de proyectos en la Defensoría Pública.
---	---

Sostenibilidad: fase de Operación:

Fecha de inicio de la operación del proyecto	01/01/2012
Entidad encargada de la operación del proyecto	Defensoría Pública
Financiamiento de la operación del proyecto	
- Gasto permanente (corriente)	74.490*
- Gasto no permanente (inversión)	149.296,70
Transferencia de la operación del proyecto	
- Nombre de la institución a la que se transfiere	
- Documento que respalda la transferencia	-
Se cuenta con Modelo de Gestión	Si () No (X)
Breve descripción modelo de gestión para la operación del proyecto:	
<i>Describe los principales factores que pueden poner en riesgo la sostenibilidad del proyecto.</i>	Que no sean acreditados los Consultorios Jurídicos Gratuitos a cargo de las Facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas


* Se considera el sueldo de las personas que trabajan en la Dirección

Análisis presupuestario del proyecto


Presupuesto del proyecto:

Detalle	Acrónimos	Año 2011	Año 2012	Año 2013
Valor del Trabajo Planificado, proyecto original		110.000	40.000	40.000
Valor del Trabajo Planificado Acumulado	PV	110.000	150.000	190.000
Asignación anual codificada en el proyecto	AP	0	155.100	77.376
Costo real del trabajo realizado		0	77.186	72.061
Costo real acumulado del trabajo realizado	AC	0	77.186	149.247
Saldo por devengar del proyecto	SD	0	77.914	5.315

Índices de desempeño	Valor
Índice de cumplimiento presupuestario del proyecto	0,79
Índice de cumplimiento en el año 2011	-
Índice de cumplimiento en el año 2012	0,50
Índice de cumplimiento en el año 2013	0,93

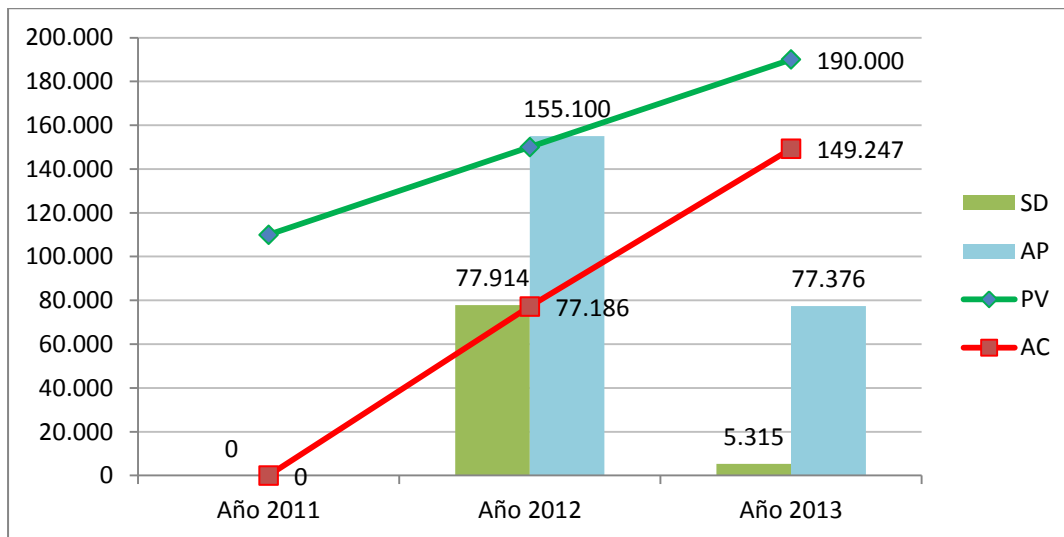

Resumen descriptivo según ítem de gasto

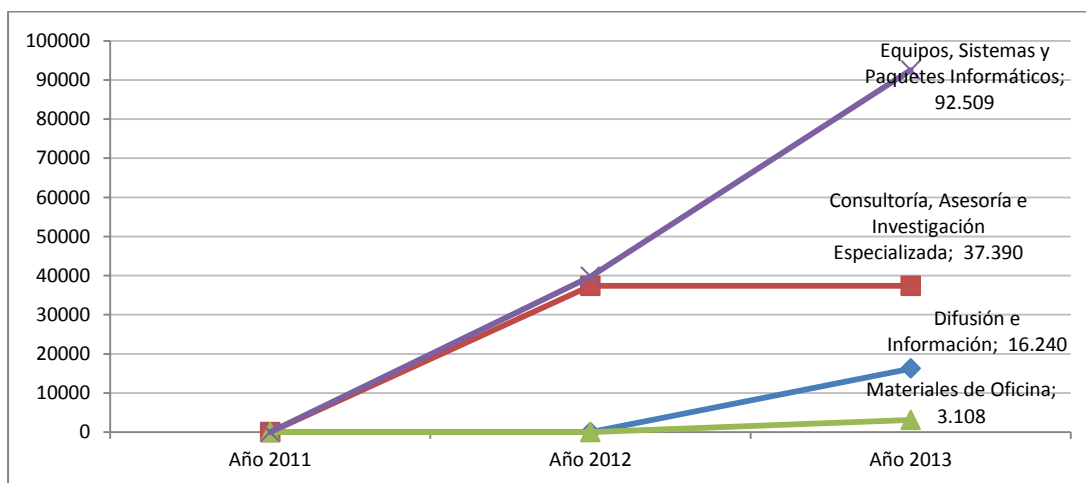

Item presupuestario	Nombre de la partida	Presupuesto	Detalle
730204 001	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones..	0	Se tenía presupuestado en el proyecto 4.608,05 con la finalidad de realizar publicaciones para todos los consultorios Jurídicos, sin embargo la unidad de acreditación no consideró oportuna realizar esta actividad, ya que se difundió el modelo de acreditación y otros productos que la unidad disponía al 100% de los consultorios Jurídicos acreditados
730207 001	Difusión, Información y Publicidad	0	A inicios de años el proyecto presupuesta en la partida, Difusión Información y Publicidad, de acuerdo a las actividades se actualiza y se realizando un "intra" interno cargando a la partida 730217 – Difusión e información
730217 001	Difusión e Información	16.240	Se utilizó para la Difusión e información de las actividades realizadas por la unidad de acreditación
730601 001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	37.390	Se contrató en el año 2012 una Consultoría de Asesoría e Investigación Especializada para comenzar con la ejecución del proyecto, en la que se alcanzó 8 productos: Índices de calidad de los servicios prestados por los consultorios jurídicos de las facultades de derecho de las universidades y demás entidades diferentes a la Defensoría Pública, de modo que permitan regular, autorizar y supervisar su funcionamiento.

			<p>Índices de calidad de la prestación de servicios de mediación de la Defensoría Pública.</p> <p>Modelo de gestión del sistema de acreditación que contemple el modelo gestión de consultorios jurídicos de universidades, el modelo de gestión para la Dirección Nacional de Acreditación de la Defensoría Pública y el sistema de seguimiento y control de las entidades que prestarán los servicios de consulta, asesoramiento y patrocinio a grupos de atención prioritaria en el territorio nacional.</p> <p>Propuesta de reglamento de acreditación a entidades (universidades, GAD's, ONG's, etc.) que presten servicios de consulta, asesoramiento y patrocinio a grupos de atención prioritaria que permita regular, autorizar y supervisar su funcionamiento.</p> <p>Catastro de las universidades con facultades de derecho que prestan servicios de consulta, asesoramiento y patrocinio a grupos de atención prioritaria en el territorio nacional.</p> <p>Catastro de los GAD's (gobiernos cantonales y provinciales), que prestan servicios de consulta, asesoramiento y patrocinio a grupos de atención prioritaria.</p> <p>Línea base de universidades que tienen consultorios jurídicos y de otras entidades que prestan servicios de consulta, asesoramiento y patrocinio a grupos de atención prioritaria en territorio nacional.</p> <p>Evaluación a los consultorios jurídicos de las universidades en el territorio nacional.</p>
730804 001	Materiales de Oficina	3.108,04	Para la implementación de la unidad de acreditación fue necesaria la compra de adquisición de suministros y materiales necesarios para el normal desarrollo de las labores institucionales.
840107 001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	92.508,89	El 62% de la inversión se destinó a la inversión en equipos sistemas y paquetes informáticos, los mismos que se destinaron al mejoramiento de la capacidad instalada, fortalecimiento institucional y a la implementación de la Unidad de acreditación y el sistema de información.

Datos personales:

Nombre de funcionario que reporta el informe: Max Abel Paredes

CI: 1710457530

Cargo: Analista de Planificación

Subsecretaría/ Dirección: Planificación

Correo electrónico: mparedes@defensoria.gob.ec

Fecha del reporte: 13/01/2014

Firma: _____
